

Status for sygehusbyggerier

- projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr.
(kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt)

Opdateret: Juli 2012

Oversigt:

OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: Afsluttes

1. OUH, Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense 2012
2. OUH, P-hus, Svendborg 2013
3. OUH, FAM, Svendborg 2012

SLB:

4. Vejle, Sterilcentral 2012
5. Vejle, Bygning A8 + acceleratorrum 2012

6. Oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab.

7. Oversigt over afsluttede byggerier.

Projekt navn: Dagkirurgi og Da Vinci-center

Projekttype: Ombygning

Periode: 2011 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektkategori:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 43,241 mio. kr. til etablering af dagkirurgi og Da Vinci-center i Odense

Ajournført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
1,370	41,871

Projektstade: Projektet som har til formål at udbygge OUH's operationskapacitet og samtidig installere den første operationsrobot i Region Syddanmark blev godkendt af Regionsrådet i juni 2011. Projektet har været i licitation og er igangsat i december 2011. Projektet forløber i overensstemmelse med tidsplan og økonomi, hvor 1. etape er færdig, mens 2. etape forventes færdig til august og 3. etape, der har kørt sideløbende med etape 1., forventes færdig i oktober 2012.

Næste step: Ibrugtagning i løbet af oktober 2012.

Næste politiske behandling: Anlægsregnskab

Bemærkning:



Da Vinci

Projekt navn: P-hus - Svendborg

Projekttype: Nybyggeri

Periode: 2011 - 2013

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 27,0 mio. kr.

Ajournført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
0,009	26,995

Projektstade: Regionsrådet godkendte den 12. december 2011 et ideoplæg for et P-hus med enten 400, 500 eller 600 pladser. Samtidig blev meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Der har været afholdt en første licitation, som det blev besluttet at aflyse, da byggeriet af 400 pladser ikke kunne realiseres af de afsatte midler. Den anden licitation er godkendt med realisering af 381 pladser. Den fysiske igangsætning af byggeriet sker primo juli.

Næste step: Igangsætning af byggeriet.

Næste politiske behandling: Indvielse januar 2013.

Bemærkning:

Den blå ramme angiver P-husets planlagte placering på parkeringspladsen ud mod Sct. Jørgens Vej



Projekt navn: **FAM, Svendborg**

Projekttype: Nybyggeri + ombygning

Periode: 2008 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 81,687 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)


Forbrug pr. 31.12.11	2012
72,950	8,737

Projektstade: Under afslutning
Akutmodtagelsen blev taget i brug i september måned 2011, og de sidste byggearbejder afsluttet i januar 2012. Der pågår p.t. forhandling med rådgiver og entreprenør vedr. ekstrakrav.

Næste step: Aflæggelse af anlægsregnskab

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Udover nybygning af akutmodtagelse, involverer projektet også operationsstuer, ombyg. af fødestuer og MR-scanner nr. 2. Projektet har muliggjort, at sygehuset i Faaborg er nedlagt fra sommeren 2011.

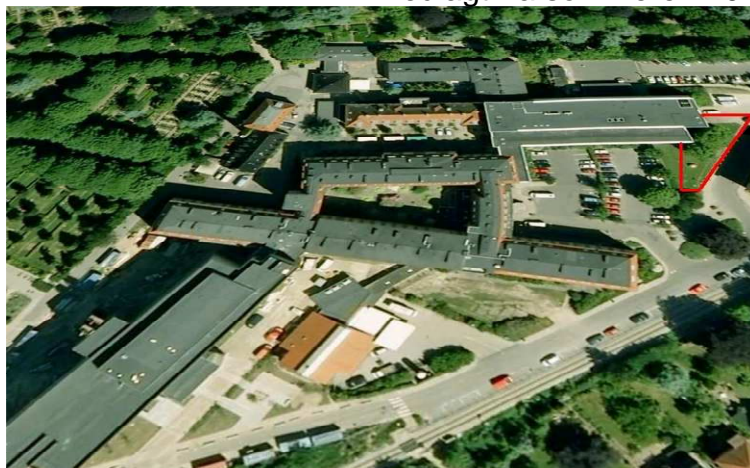

FAM, Svendborg

Projekt navn: Vejle, sterilcentral

Projekttype: Udvidelse og renovering

Periode: 2010 - 2012

Styringsmanual Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 30,408 mio. kr. finansieret af finanslovspuljen 2010 til fremrykning af mindre vedligeholdelsesprojekter.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
7,342	23,066

Projektstade: Facadebeklædning af skakt pågår. Ombygningsarbejder pågår.

Næste step: Facadebeklædning af skakt færdiggøres medio 2012. Ombygningsarbejder fortsættes. Maskinarbejder fortsættes.

Næste politiske behandling:

Bemærkning: En udvidelse kombineret med ombygning af de eksisterende lokaler, udskiftning af produktionsudstyret, samt en decentralisering af dampforsyningen. Projektet forventes færdigt i 2012.

Projekt navn: Vejle, bygning A8 + acceleratorrum

Projekttype: Ombygning

Periode: 2007 - 2012

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Ramme: -

Anlægsbevilling: 73,935 mio. kr.

Ajourført udgiftsoverslag:
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.11	2012
69,322	4,613

Projektstade: Retablering af anlæg efter byggeriet pågår.
Licitation på ombygning af to eksisterende onkologiske etager er afholdt.

Næste step: Retablering af anlæg efter byggeriet fortsættes.
Ombygning af to eksisterende onkologiske etager påbegyndes.

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Projektet omfatter nybyggeri af en strålekælder og tre etager. I strålekælderen etableres accelerator 5 og 6. De tre etager indeholder faciliteter i forbindelse med strålebehandlingen. I forbindelse med rokaden til den nye bygning, skal to eksisterende onkologiske etager ombygges.

Projektet forventes færdig i 2012.



Acceleratorrum

Oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab		
Projekt	Periode	Beløb (i mio. kr.)
OUH:		
1. Udvidelse af intensivkapacitet, Odense	2011 - 2012	57,214
2. FAM, Odense	2008 - 2012	178,352
3. Frysehus, Odense	2010 - 2012	27,397
SVS:		
1. P-hus, Esbjerg	2008 - 2011	58,037
SLB:		
1. Ekstra etager på dagkirurgisk bygning, Vejle	2009 - 2012	28,496
SHS		
1. Fase 1, Sønderborg	2009 - 2012	29,508
2. Ombygn. af øjenafdelingen, Sønderborg	2010 - 2012	17,205

Oversigt over afsluttede byggerier		
Projekt	Periode	Beløb (i mio. kr.)
OUH:		
1. Indretning af vestfløjen, fraflyttet intensiv - og - opvågningsområde	2007 - 2010	159,808
2. Tre etager på patienthotel	2009 - 2010	56,471
3. H.C. Andersen børnehospital	2004 - 2010	61,410
4. OUH - P-hus	2010 - 2011	43,284
SVS:		
5. Masterplan Grindsted, inkl.. flytning af neurorehabilitering, Varde	2006 - 2010	24,826
6. Etape 6.3.1 etabl. af midlertidig sengebygning	2007 - 2010	65,061
SLB:		
7. Sygehus Lillebælt - Kolding		
- Interimplan - Etape 1	2007 - 2010	35,862
- Interimplan - Etape 2	2008 - 2010	28,214
8. Parkeringshus i Vejle	2009 - 2010	43,224
9. Middelfart, Rygcenter	2009 -2011	44,299
